

Perkebunan Nusantara

kinra SEI MANGKEI

INDONESIA SEZ DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Bagian Manajemen Risiko dan TI

Current Issue Bidang Manajemen Risiko

No	Issue	Dampak	Dukungan yang dibutuhkan
1	Formulir Pengisian RAM (Risk Assessment Matrix) yang bersumber dari Danantara sudah disosialisasikan oleh Holding namun ada beberapa variable diantaranya Risk Driver yang masih memerlukan guidance dari holding	Pengisian Form membutuhkan waktu sd hari Senin 12 Okt 2026	
2	Laporan Manajemen Risiko Bulan Agustus dan September belum terdeliver ke Holding	Menjadi catatan keterlambatan laporan ke holding	
3	Perbaikan pengisian RKAP Manajemen Risiko yang telah dilakukan challenge session	Perbaikan dibutuhkan dalam buku RKAP	
4	Pembuatan Tanggapan Hasil Penilaian RMI	Keterlambatan penyerahan laporan hasil penilaian RMI	
5	Pendampingan Sertifikasi ISO 50001 (Sistem Manajemen Energi) Oleh Konsultan PT Bersinergi Tridharma Sukses		

Progress Project di Bidang Manajemen Risiko
Sub Bidang Manajemen Risiko

No	Nama Project	End Date Project	% Progress	Yang telah dilakukan (*done*)	*Next Action*	Dukungan yang dibutuhkan
A.1.1	Implementasi Aplikasi New Enterprise Risk Intelligence Nusantara (ERIN)	30 Oktober 2026			• Pengisian Risiko Secara Top Down berdasarkan RJPP, RKAP dan KPI	-
A.1.2	Penerapan Business Continuity Management System (BCMS)	Desember 2026	10%	• Proses penyesuaian Pedoman & Kebijakan BCMS	• Mereviu Pedoman & Kebijakan BCMS	-
A.1.3	Penilaian Risk Maturity Index (RMI) Oleh Tim BPKP	25 September 2026	100%	• Penyerahan dokumen penilaian RMI ke BPKP • Proses penilaian RMI oleh BPKP dan pendampingan proses penilaian telah selesai dilaksanakan • Hasil Penilaian RMI dengan Nilai 2,0	• Membuat tanggapan atas penilaian RMI oleh BPKP	
A.1.4	LM Triwulanan Manajemen Risiko					
A.1.5	Penyusunan RKAP Manajemen Risiko 2027					
A.1.6	Tindak Lanjut Saran Perbaikan Hasil Penilaian RMI	Desember 2026		• Proses penilaian RMI oleh BPKP telah selesai dilaksanakan dan notisi hasil penilaian telah diterima. • Tindak lanjut difokuskan pada identifikasi saran perbaikan dan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan penerapan manajemen risiko	• Menyusun matriks rencana tindak lanjut saran perbaikan hasil penilaian RMI (05 November 2026)	

Progress Project di Bidang Sistem Manajemen
Sub Bidang Sistem Manajemen

No	Nama Project	End Date Project	% Progress	Yang telah dilakukan (*done*)	*Next Action*	Dukungan yang dibutuhkan
A.2.1	Sertifikasi ISO 14001 (Sistem Manajemen Lingkungan)	27 Februari 2026	100%	• Sertifikasi telah diselesaikan sesuai target • Sertifikat ISO 14001 telah terbit dan diterima PT KINRA	• Memastikan Implementasi Sistem Manajemen Lingkungan berjalan konsisten	Arahan dan dukungan dalam memastikan konsistensi penerapan Sistem Manajemen Lingkungan
A.2.2	Reviu SOP Seluruh Bagian	Juni 2026	100%	• Penyelarasan format SOP, logo terbaru, Kodering Bagian sesuai dengan SKPTS Direktur PT KINRA Nomor: KINRA/SKPTS/ 12026 Tentang Perubahan Struktur Organisasi PT Kawasan Industri Nusantara • Seluruh SOP telah dilakukan persetujuan dan pengesahan		Dukungan dalam memastikan kepatuhan seluruh Bagian terhadap penerapan SOP
A.2.3	Audit Surveillance ISO 9001 (Sistem Manajemen Mutu)	8 September 2026	100%	• Audit Surveillance ISO 9001 telah selesai dilaksanakan • Hasil Audit direkomendasikan untuk mempertahankan sertifikat ISO 9001	• Berkoordinasi dengan Bagian terkait dan melakukan monitoring atas rekomendasi peluang perbaikan dari lembaga sertifikasi	Arahan dan dukungan untuk memastikan rekomendasi peluang perbaikan dilaksanakan oleh bagian terkait
A.2.4	Audit Resertifikasi ISO 45001 (Sistem Manajemen K3)	8 September 2026	100%	• Audit Surveillance ISO 45001 telah selesai dilaksanakan • 1 temuan minor telah diselesaikan yaitu penyerahan kepada auditor terkait Program dan jadwal pelaksanaan inspeksi safety & APD yang dilakukan oleh tim K3 pada tanggal 11 September 2026 • Sertifikat ISO 45001 telah terbit dan diterima PT KINRA	• Berkoordinasi dengan Bagian terkait dan melakukan monitoring atas rekomendasi peluang perbaikan dari lembaga sertifikasi	Arahan dan dukungan untuk memastikan rekomendasi peluang perbaikan dilaksanakan oleh bagian terkait
A.2.5	Audit Survillance ISO 37001 (Sistem Manajemen Anti Penyuapan)	29 September 2026	100%	• Audit Surveillance ISO 45001 telah selesai dilaksanakan • 2 temuan minor telah diselesaikan yaitu penyerahan kepada auditor terkait bukti pelatihan/ awareness antipenyuapan kepada rekan bisnis dan Notulen Rapat Tinjauan Manajemen (Sistem Manajemen Anti Penyuapan) • Sertifikat ISO 37001 telah terbit dan diterima PT KINRA	• Berkoordinasi dengan Bagian terkait dan melakukan monitoring atas rekomendasi peluang perbaikan dari lembaga sertifikasi	Arahan dan dukungan untuk memastikan rekomendasi peluang perbaikan dilaksanakan oleh bagian terkait
A.2.6	Sertifikasi ISO 50001 (Sistem Manajemen Energi)	17 Desember 2026	0%	• Proses pengadaan jasa pendampingan sertifikasi ISO 50001 telah selesai dan penyedia jasa, yaitu PT Bersinergi Tridharma Sukses	• Pelaksanaan pendampingan sertfikasi ISO 50001 oleh konsultan meliputi gap analysis, penyusunan dokumentasi sistem manajemen energi, pelatihan, pendampingan implementasi, dan persiapan audit	Arahan dan dukungan koordinasi Bagian dalam penyediaan data, penetapan personel penanggung jawab, sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaan


Progress Project di Bidang Sistem Manajemen
Sub Bidang Sistem Manajemen

No	Nama Project	End Date Project	% Progress	Yang telah dilakukan (*done*)	*Next Action*	Dukungan yang dibutuhkan
A.2.7	Peningkatan Kualitas K3			• Berkoordinasi dengan PIC yang melakukan Initial Review atas Pelaksanaan K3 saat ini	• Menyusun rencana tindak lanjut bagi masing-masing bagian untuk input rencana penyelesaian rencana tindak lanjut oleh masing-masing bagian	



kinra
SEI MANGKEI

A Charter Bidang Manajemen Risiko

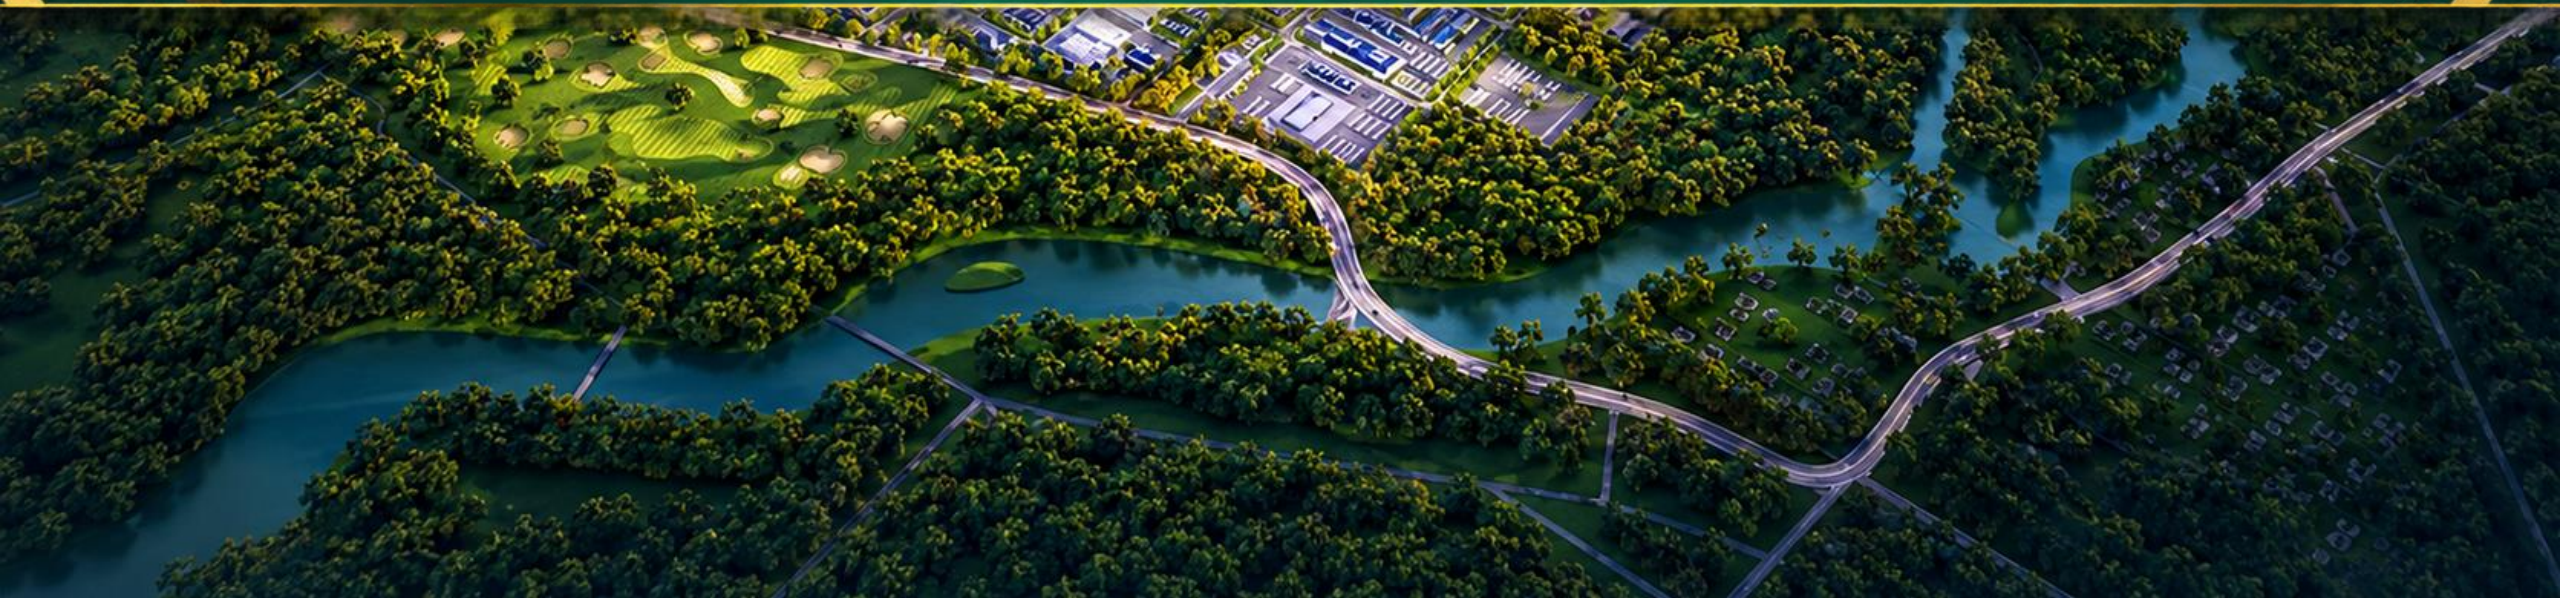

A.1.1. Implementasi Aplikasi New Enterprise Risk Intelligence Nusantara (ERIN)

Periode Laporan	M2 Oktober 2026	PIC	Kepala Sub Bagian Manajemen Risiko
Project	*Implementasi Aplikasi ERIN*	Target	Desember 2026

Update progress

Total															
Progress	Timeline 2026														
Activities	Status		Okt				Nov				Des				
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
		Target													
		Real													
		Target													
		Real													
		Target													
		Real													
		Target													
		Real													
		Target													
		Real													
		Target													
		Real													
		Target													
		Real													
		Target													
		Real													

Status Capaian: Rencana/*on-going* · Selesai · Sedikit Tertunda · Perlu Perhatian Khusus

Update Saat ini

Update Saat Ini (Yang telah dilakukan)

- 1

Problem Identification -> Corrective Action

Problem Identifcation :

Corrective Action :

Next Step (Rencana Kerja)

- 1

A.1.2. Penerapan Business Continuity Management System (BCMS)

Periode Laporan	M2 Oktober 2026	PIC	Kepala Sub Bagian Manajemen Risiko
Project	*Penerapan Business Continuity Managemen System*	Target	Desember 2026

Update progress

Total															
Progress	Timeline 2026														
Activities	Status		Okt				Nov				Des				
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Adopsi dan penyesuaian substansi kebijakan, pedoman, SOP dari Holding		Target												
		Real												
Penyusunan draft dokumen		Target												
		Real												
Reviu Internal		Target												
		Real												
Persetujuan dan pengesahan		Target												
		Real												
Sosialisasi dan Implementasi		Target												
		Real												

Status Capaian: Rencana/*on-going* | Selesai | Sedikit Tertunda | Perlu Perhatian Khusus

Update Saat ini

Update Saat Ini (Yang telah dilakukan)

- Mempelajari dokumen kebijakan, pedoman dan SOP BCMS dari Holding sebagai referensi penyusunan dokumen BCMS PT KINRA

Problem Identification -> Corrective Action

Problem Identifcation :

Diperlukan penyesuaian substansi dokumen dari holding agar sesuai dengan proses bisnis PT KINRA

Corrective Action :

Melakukan penyesuaian dokumen BCMS dari holding dengan proses bisnis PT KINRA

Next Step (Rencana Kerja)

- Menyesuaikan substansi kebijakan, pedoman, SOP agar sesuai dengan proses bisnis PT KINRA (23 Oktober 2026)

A.1.3. Penilaian Risk Maturity Index (RMI) Oleh Tim BPKP

Periode Laporan	M2 Oktober 2026	PIC	Kepala Sub Bagian Manajemen Risiko
Project	Penilaian Risk Maturity Index (RMI)	Target	Desember 2026

Update progress

Total	100%

Progress			Timeline 2026																			
Activities	Status		Juni				Juli				Agustus				September				Oktober			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Penentuan Pelaksanaan RMI Tahun Maturitas 2025		Target																				
		Real																				
Pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penilaian RMI		Target																				
		Real																				
Ekspose tentang RMI		Target																				
		Real																				
Entry Meeting Penilaian RMI Maturitas Tahun 2025		Target																				
		Real																				
Penilaian RMI		Target																				
		Real																				
Pembuatan Notisi Hasil Penilaian RMI																						
Laporan RMI																						

Status Capaian: Rencana/*on-going* | Selesai | Sedikit Tertunda | Perlu Perhatian Khusus

Update Saat ini

Update Saat Ini (Yang telah dilakukan)

- Proses penilaian RMI oleh BPKP telah selesai dilaksanakan dan notisi hasil penilaian telah diterima PT KINRA

Problem Identification -> Corrective Action

Problem Identifcation :

Corrective Action :

Next Step (Rencana Kerja)

A.1.3. Penilaian Risk Maturity Index (RMI) Oleh Tim BPKP

Periode Laporan	M2 Oktober 2026	PIC	Kepala Sub Bagian Manajemen Risiko
Project	Penilaian Risk Maturity Index (RMI)	Target	Desember 2026

Update progress

Total

Progress			Timeline 2026											
Activities	Status		Okt				Nov				Des			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Hasil Penilaian RMI **<Fase Berkembang>**, dengan perolehan skor sebesar 2,00 telah diterima.		Target												
		Real												
Membuat tanggapan atas hasil penilaian RMI oleh BPKP		Target												
		Real												
Penyerahan Berita Acara Hasil Penilaian RMI		Target												
		Real												
Tindak Lanjut terhadap saran perbaikan atas hasil penilaian RMI		Target												
		Real												

Status Capaian: Rencana/*on-going*, Selesai, Sedikit Tertunda, Perlu Perhatian Khusus

Update Saat ini

Update Saat Ini (Yang telah dilakukan)

- Hasil penilaian Hasil Penilaian RMI **<Fase Berkembang>**, dengan perolehan skor sebesar 2,00 telah diterima pada tanggal 19 Oktober 2026.
- Tanggapan atas hasil penilaian RMI telah dikirimkan ke BPKP (19 Oktober 2026)

Problem Identification -> Corrective Action

Problem Identifcation :

Berita acara hasil penilaian RMI oleh BPKP masih menunggu penyampaian resmi sebagai dasar untuk mengetahui hasil akhir dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.

Corrective Action :

Melakukan koordinasi dan pemantauan atas penerbitan berita acara hasil penilaian RMI oleh BPKP s Hasil Penilaian RMI

Next Step (Rencana Kerja)

- Menerima Berita Acara Hasil Penilaian RMI (November 2026)
- Membuat program tindak lanjut terhadap saran perbaikan atas hasil penilaian RMI serta monitoring atas tindak lanjut perbaikan atas hasil penilaian RMI

A.1.4. LM Triwulanan Manajemen Risiko

Periode Laporan	M2 Oktober 2026	PIC	Kepala Sub Bagian Manajemen Risiko
Project	*LM Triwulan Manajemen Risiko*	Target	Desember 2026

Update progress

Total															
Progress	Timeline 2026														
Activities	Status		Okt				Nov				Des				
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
		Target													
		Real													
		Target													
		Real													
		Target													
		Real													
		Target													
		Real													
		Target													
		Real													
		Target													
		Real													
		Target													
		Real													
		Target													
		Real													

Status Capaian: Rencana/*on-going* · Selesai · Sedikit Tertunda · Perlu Perhatian Khusus

Update Saat ini

Update Saat Ini (Yang telah dilakukan)

- 1

Problem Identification -> Corrective Action

Problem Identifcation :

Corrective Action :

Next Step (Rencana Kerja)

- 1

A.1.5. Penyusunan RKAP Manajemen Risiko 2027

Periode Laporan	M2 Oktober 2026	PIC	Kepala Sub Bagian Manajemen Risiko
Project	*Penyusunan RKAP Manajemen Risiko 2027*	Target	Desember 2026

Update progress

Total

Progress			Timeline 2026											
Activities	Status		Okt				Nov				Des			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pembuatan Risk Register		Target												
		Real												
Pembuatan RAM		Target												
		Real												
Pembuatan RAS		Target												
		Real												
Pembuatan Rencana Aksi Mitigasi		Target												
		Real												
Pembuatan Risiko Utama		Target												
		Real												
Koordinasi dengan Seluruh Bagian (Penyamaan persepsi terkait Risiko Perusahaan)		Target												
		Real												
		Target												
		Real												
		Target												
		Real												

Status Capaian: Rencana/*on-going* · Selesai · Sedikit Tertunda · Perlu Perhatian Khusus

Update Saat ini

Update Saat Ini (Yang telah dilakukan)

- Risk Register, RAM, RAS, Rencana Aksi Mitigasi dan Risiko Utama telah disusun. Proses ini mencakup identifikasi risiko, analisis dan evaluasi tingkat risiko, penetapan rencana mitigasi berdasarkan sasaran dan kondisi perusahaan

Problem Identification -> Corrective Action

Problem Identifcation :

Masih diperlukan penyamaan persepsi dengan bagian terkait mengenai identifikasi risiko, penyebab dan dampak risiko, penilaian tingkat risiko serta penetapan risiko utama perusahaan.

Corrective Action :

- Melakukan koordinasi dan diskusi dengan bagian terkait untuk menyamakan persepsi mengenai penilaian risiko.
- Melakukan riviu dan penyelarasan atas risiko yang diidentifikasi agar sesuai dengan kondisi operasional.

Next Step (Rencana Kerja)

- Melaksanakan koordinasi dengan seluruh bagian untuk melakukan konfirmasi dan validasi atas risiko yang telah diidentifkasi, menyepakati hasil penilaian risiko, serta menetapkan risiko utama perusahaan.

A.1.6. Tindak Lanjut Saran Perbaikan Hasil Perbaikan Hasil Penilaian RMI

Periode Laporan	M2 Oktober 2026	PIC	Kepala Sub Bagian Manajemen Risiko
Project	*Tindak Lanjut Saran Perbaikan RMI*	Target	Desember 2026

Update progress

Total

Progress			Timeline 2026											
Activities	Status		Okt				Nov				Des			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Melakukan reviu atas notisi hasil penilaian RMI		Target			■									
		Real												
Mengidentifikasi dan menginventarisasi saran perbaikan yang disampaikan BPKP		Target				■								
		Real												
Melakukan analisis dan mengidentifikasi penerapan manajemen risiko		Target					■	■						
		Real												
Menyusun rencana aksi tindak lanjut atas saran perbaikan (Menetapkan PIC dan bukti penyelesaian)		Target							■	■	■	■		
		Real												
Melakukan koordinasi dengan Bagian Terkait		Target									■			
		Real												
Melaksanakan dan memonitor progres tindak lanjut saran perbaikan		Target											■	■
		Real												

Status Capaian: Rencana/*on-going* · Selesai · Sedikit Tertunda · Perlu Perhatian Khusus

Update Saat ini

Update Saat Ini (Yang telah dilakukan)

- Proses penilaian RMI oleh BPKP telah selesai dilaksanakan dan notisi hasil penilaian telah diterima.
- Tindak lanjut difokuskan pada identifikasi saran perbaikan dan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan penerapan manajemen risiko

Problem Identification -> Corrective Action

Problem Identifcation :

Diperlukan analisis lebih lanjut terhadap saran perbaikan untuk menentukan prioritas perbaikan

Corrective Action :

Melakukan riviu dan pemetaan saran berdasarkan notisi hasil penilaian RMI dan menentukan aksi perbaikan yang di lengkapo dengan PIC, target waktu, dan bukti penyelesaian.

Next Step (Rencana Kerja)

- Menyusun matriks rencana tindak lanjut saran perbaikan hasil penilaian RMI (05 November 2026)

A.2.6. Sertifikasi ISO 50001 (Sistem Manajemen Energi)

Periode Laporan	M2 Oktober 2026	PIC	Kepala Sub Bagian Manajemen Risiko
Project	*Sertifikasi ISO 50001*	Target	Desember 2026

Update progress

Total

Progress			Timeline 2026											
Activities	Status		Okt				Nov				Des			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Meeting Persiapan Awal Pendampingan ISO 50001		Target												
		Real												
Kick Off, Pengenalan Dasar Persyaratan SMEn & Sosialisasi Kebijakan SMEn		Target												
		Real												
Persiapan Tim SMEn, Data Energi 1 tahun, Data Energi Signifikan, Proyek Peningkatan		Target												
		Real												
Training Pemahaman Implementasi ISO 50001		Target												
		Real												
Workshop penyusunan target, program dan risiko SMEn		Target												
		Real												
Training Internal Auditor SMEn		Target												
		Real												
Sosialisasi Manual SMEn		Target												
		Real												
Sosialisasi SOP & Implementasi		Target												
		Real												

Status Capaian: Rencana/*on-going* · Selesai · Sedikit Tertunda · Perlu Perhatian Khusus

Update Saat ini

Update Saat Ini (Yang telah dilakukan)

- Koordinasi pelaksaan pekerjaan pendampingan sertifikasi dengan konsultan
- Melaksanakan rapat koordinasi awal membahas rencana kerja bersama konsultan pada tanggal 19 Oktober 2026
- Melaksanakan Kick Off, Pengenalan Dasar Persyaratan SMEn & Sosialisasi Kebijakan SMEn (22 Oktober 2026)

Problem Identification -> Corrective Action

Problem Identifcation :

- Memastikan kesesuaian timeline dengan target dan kesiapan masing-masing Bagian
- Data Energi, dokumen pendukung, serta sumber daya yang diperlukan untuk implementasi ISO 50001 perlu diidentifikasi dan dipersiapkan

Corrective Action :

- Melaksanakan pemantauan progres secara berkala dan memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai timeline hingga audit sertifikasi
- Berkoordinasi dengan konsultan dan seluruh bagian untuk mengidendifikasi kebutuhan data, sumber daya dan PIC

Next Step (Rencana Kerja)

- Pelaksanaan Training Pemahaman Implementasi ISO 50001 (26 Oktober 2026)

A.2.6. Sertifikasi ISO 50001 (Sistem Manajemen Energi)

Periode Laporan	M2 Oktober 2026	PIC	Kepala Sub Bagian Manajemen Risiko
Project	*Sertifikasi ISO 50001*	Target	Desember 2026

Update progress

Total

Progress			Timeline 2026											
Activities	Status		Okt				Nov				Des			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Implementasi SMEn (Penyusunan Dokumen & Catatan)		Target												
		Real												
Internal Audit		Target												
		Real												
Tinjauan Manajemen		Target												
		Real												
Eksternal Audit TUV Stage 1		Target												
		Real												
Eksternal Audit TUV Stage 2		Target												
		Real												
Perbaikan Hasil Audit TUV		Target												
		Real												

Status Capaian: Rencana/*on-going* · Selesai · Sedikit Tertunda · Perlu Perhatian Khusus

Update Saat ini

Update Saat Ini (Yang telah dilakukan)

- Koordinasi pelaksaan pekerjaan pendampingan sertifikasi dengan konsultan
- Melaksanakan rapat koordinasi awal membahas rencana kerja bersama konsultan pada tanggal 19 Oktober 2026
- Melaksanakan Kick Off, Pengenalan Dasar Persyaratan SMEn & Sosialisasi Kebijakan SMEn (22 Oktober 2026)

Problem Identification -> Corrective Action

Problem Identifcation :

- Memastikan kesesuaian timeline dengan target dan kesiapan masing-masing Bagian
- Data Energi, dokumen pendukung, serta sumber daya yang diperlukan untuk implementasi ISO 50001 perlu diidentifikasi dan dipersiapkan

Corrective Action :

- Melaksanakan pemantauan progres secara berkala dan memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai timeline hingga audit sertifikasi
- Berkoordinasi dengan konsultan dan seluruh bagian untuk mengidendifikasi kebutuhan data, sumber daya dan PIC

Next Step (Rencana Kerja)

- Pelaksanaan Training Pemahaman Implementasi ISO 50001 (26 Oktober 2026)



Perkebunan Nusantara

kinra SEI MANGKEI

INDONESIA SEZ DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Bagian Teknologi Informasi

Current Issue Bidang Teknologi Informasi

No	Issue	Dampak	Dukungan yang dibutuhkan
1	PT KINRA belum memiliki Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI)	Belum ada dokumen resmi yang menjadi panduan dalam melakukan transformasi digital di Kawasan	
2	Keterbatasan SDM TI dalam menjalankan fungsi operasional dan tata kelola TI	Fungsi TI masih terbagi antara kebutuhan operasional harian, pengembangan sistem, keamanan, serta pemenuhan tata kelola dan IT Maturity	
3	Belum optimalnya pengelolaan layanan dan penanganan gangguan TI	Penanganan permintaan dan gangguan TI belum sepenuhnya terstandar dan terdokumentasi sehingga monitoring kualitas layanan dan evaluasi berkelanjutan masih perlu diperkuat	
4	Draft RKAP TI 2027 belum tersedia		

Progress Project di Bidang Teknologi Informasi (IT Strategy & Governance)

No	Nama Project	End Date Project	% Progress	Yang telah dilakukan (*done*)	*Next Action*	Dukungan yang dibutuhkan
B.1.1	Pendataan Kebutuhan Digitalisasi tiap Bagian	19 Oktober 2026	10%	• Pembuatan Link Pendataan kebutuhan digitalisasi	• Monitoring pengisian kebutuhan digitalisasi agar dapat terselesaikan sebelum tanggal 19 Oktober 2026	-
B.1.2	Sosialisasi Penggunaan Aplikasi e-Office	28 Oktober 2026		• Meeting Daring dengan Tim Integra untuk Penjelasan Fitur yang belum pernah digunakan sebelumnya	• Sosialisasi Penggunaan E-office & Pembagian digital handbook untuk masing masing bagian	

Progress Project di Bidang Teknologi Informasi (IT Development)

No	Nama Project	End Date Project	% Progress	Yang telah dilakukan (*done*)	*Next Action*	Dukungan yang dibutuhkan
B.2.1	Pembuatan IAM	14 Oktober 2026	100%	• Pembauatan Website IAM untuk mengelola identitas user	• Penambahan fitur bulk untuk hak akses perbagian bukan perorangan	Koreksi dan Arahan terhadap hasil
B.2.2	Pembuatan Homepage Portal aplikasi	14 Oktober 2026	100%	• Pembuatan Website Homepage Portal aplikasi untuk mengakses aplikasi yang sudah diatur melalui IAM	• Penyempurnaan informasi agar lebih informatif	Koreksi dan Arahan terhadap hasil
B.2.3	Pembuatan Ticketing Aduan Internal IT	14 Oktober 2026	100%	• Pembuatan website untuk aduan internal ke IT dengan sistem	• Penambahan fitur SLA untuk batas tepat waktu nya. • Penambahan fitur Ekspor untuk laporan penyelesaian.	Koreksi dan Arahan terhadap hasil
B.2.4	Pembuatan AI Vision pembaca KWH otomatis	20 Oktober 2026	100%	• Pembuatan Web uji coba vision AI pembaca KWH	• Mmembuat dashboard untuk mekanikal sesuai permintaan yang sudah didata	Menunggu infrastuktur TI
B.2.5	Pembuatan Web Dashboard bagian Mekanikal	31 Oktober 2026	70%	• Pembuatan fitur EAP untuk pencatatan KM dan BBM serta laporan otomatis secara real time • Perancangan dan penyempurnaan fitur untuk pemantuan listrik kawasan • Pembuatan Checksheet kegiatan rutin mingguan atau bulanan	• Pengujian kedua fitur yang baru dibuat • Pengujian Fitur checksheet	-
B.2.6	Pengadaan Infrastruktur Digital dan Subscription AI untuk Akselerasi Pengembangan Aplikasi KEK Sei Mangkei	26 Oktober 2026	100%	• Pengajuan Persetujuan Direktur untuk pengadaan Infrastruktur Digital • Koordinasi dengan Bagian Keuangan untuk realisasi anggaran • Pembelian Subscription dari tiap Infrastruktur Digital	• Mengoptimalkan pemanfaatan subscription AI dalam proses pengembangan aplikasi	


Progress Project di Bidang Teknologi Informasi (Infrastructure & Operation)

No	Nama Project	End Date Project	% Progress	Yang telah dilakukan (*done*)	*Next Action*	Dukungan yang dibutuhkan
B.3.1	Pemenuhan Ketersediaan jaringan Starlink di Gedung Graha	20 Oktober 2026	30%	• Koordinasi dengan Pihak Vijja Net untuk pendataan peralatan yang dibutuhkan untuk pemasangan Router Baru di lantai 1 dan 2 • Pengajuan Pembelian kebutuhan barang yang diperlukan untuk pemenuhan ketersiaan jaringan • Dokumen Pengadaan sudah berada di Bagian keuangan untuk pengelompokan anggaran yang sesuai dengan permintaan barang	• Pembelian barang melalui pengadaan barang di bagian pengadaan	-
B.3.2	Pemasangan Starlink di Ruang Rapat Pusat Inovasi	14 Oktober 2026	100%	Sudah dilakukan Pemasangan & Konfigurasi jaringan untuk dapat digunakan pada setiap acara PT KINRA yang diselenggarakan di Ruang Rapat Nusantara Pusat Inovasi	Pemantauan jaringan secara berkala	



kinra
SEI MANGKEI

A Charter Bidang Teknologi Informasi

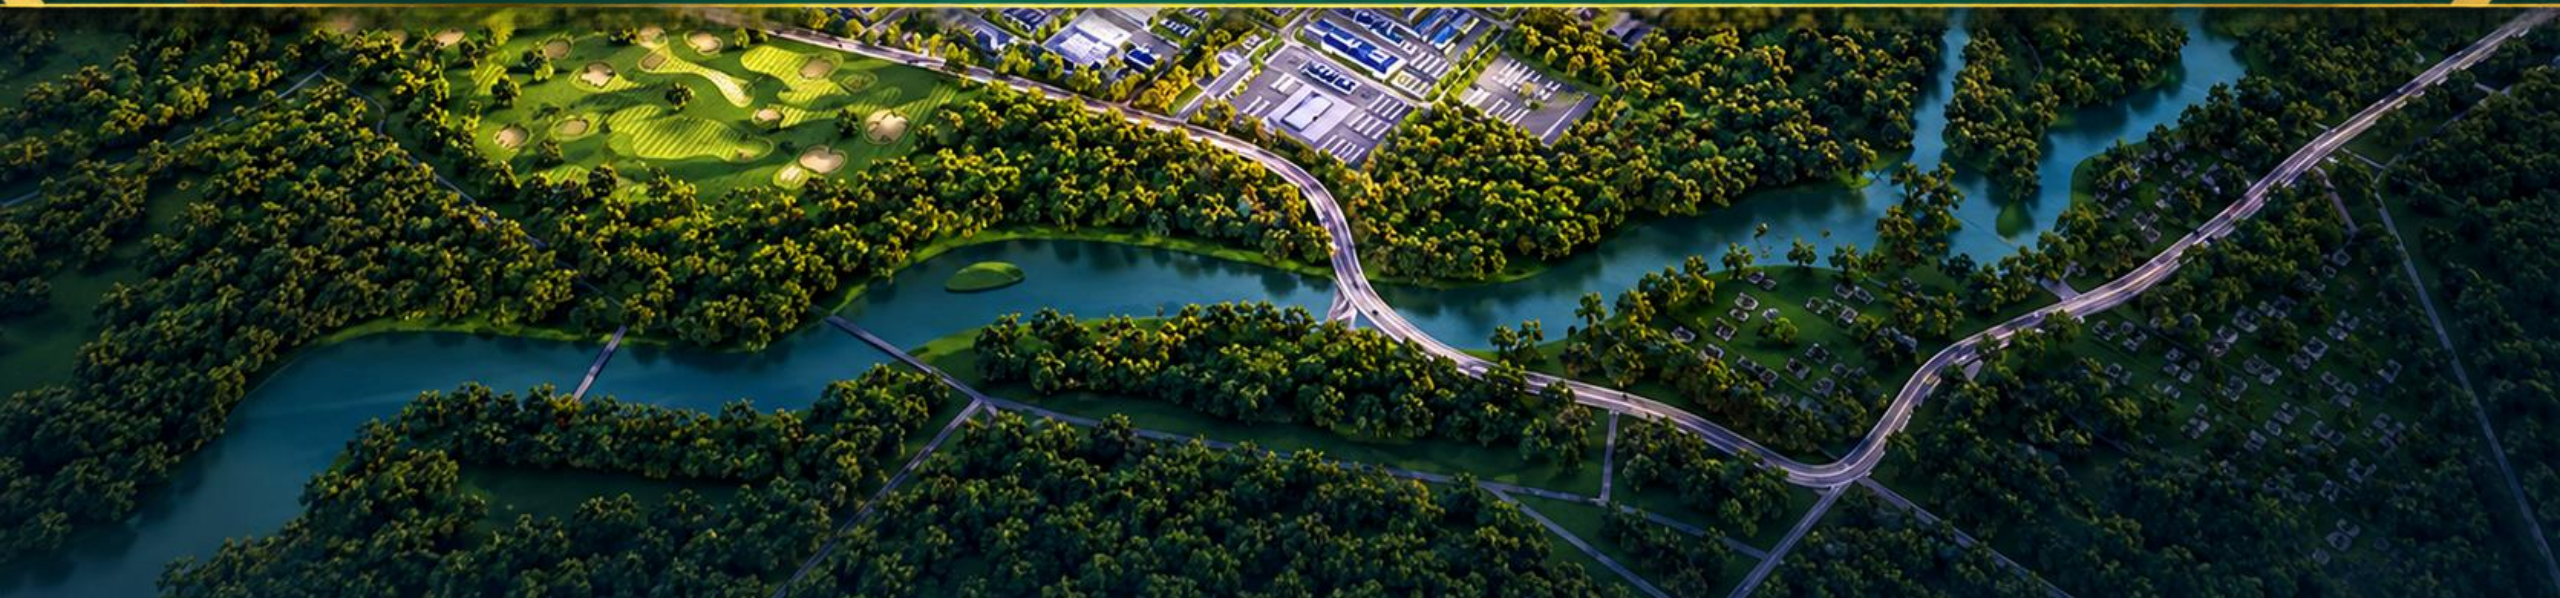

B1.1 Pendataan Kebutuhan Digitalisasi Tiap Bagian

Program Strategis	Pendataan Kebutuhan Digitalisasi tiap Bagian	PIC	Bagian Teknologi Informasi (IT Governance)
Deskripsi	Melakukan pendataan kebutuhan digitalisasi pada setiap bagian sebagai dasar identifikasi, prioritas, dan perencanaan pengembangan sistem informasi perusahaan.	Target	Penyelesaian W1 November 2026

Update progress

S.d saat ini	100%

Progress			Timeline							
Objective	Status		Oktober				November			
			1	2	3	4	1	2	3	4
1. Pembuatan aplikasi pendataan kebutuhan digitalisasi		Target								
		Real								
2. Penyampaian memo kepada seluruh bagian		Target								
		Real								
3. Distribusi link pendataan kepada seluruh bagian		Target								
		Real								
4. Sesi Wawancara untuk memvalidasi Kebutuhan		Target								
		Real								
5. Rekapitulasi dan identifikasi kebutuhan digitalisasi tiap bagian		Target								
		Real								

Status Capaian: Rencana/*on-going* · Selesai · Sedikit Tertunda · Perlu Perhatian Khusus

Update sd Saat ini

- Telah Dilakukan Pembuatan Link Pendataan kebutuhan digitalisasi
- Pendistribusian memo ke setiap bagian untuk dapat ditindaklanjuti masing masing bagian

PICA

- **Problem Identification (PI):** Pengumpulan data kebutuhan digitalisasi dari seluruh bagian belum selesai sehingga diperlukan tindak lanjut dan monitoring pengisian sesuai batas waktu yang ditetapkan.
- **Corrective Action (CA):** Melakukan koordinasi dan monitoring kepada setiap bagian untuk memastikan kebutuhan digitalisasi disampaikan secara lengkap sebelum 19 Oktober 2026.

Next Actions

- Menindaklanjuti pengisian formulir pendataan kepada setiap bagian.
- Memantau kelengkapan data kebutuhan digitalisasi sebelum 19 Oktober 2026.
- Melakukan rekapitulasi dan identifikasi kebutuhan digitalisasi berdasarkan data yang diterima.

Update Saat ini

B1.2 Sosialisasi Penggunaan E-Office

Program Strategis	Sosialisasi Penggunaan E-Office	PIC	Bagian Teknologi Informasi (IT Governance)
Deskripsi	Meningkatkan pemahaman dan kesiapan pegawai dalam menggunakan aplikasi E-Office untuk mendukung digitalisasi proses administrasi dan persuratan perusahaan.	Target	Penyelesaian W5 Oktober 2026

Update progress

S.d saat ini — **30%**

Progress			Timeline							
Objective	Status		Oktober				November			
			2	3	4	5	1	2	3	4
1. Penjadwalan Sosialisasi kepada seluruh Staff	●	Target								
		Real								
2. Simulasi dan pendampingan	●	Target								
		Real								
3. Evaluasi	●	Target								
		Real								

Status Capaian: Rencana/*on-going* · Selesai · Sedikit Tertunda · Perlu Perhatian Khusus

Update sd Saat ini

- Telah Dilakukan Meeting secara daring dengan Tim Integra untuk Penjelasan terkait fitur yang belum pernah dipakai sebelumnya

PICA

- **Problem Identification (PI):** Belum seluruh pegawai memahami alur dan tata cara penggunaan aplikasi E-Office.
- **Corrective Action (CA):** Menyiapkan materi sosialisasi, panduan penggunaan, dan koordinasi jadwal dengan bagian terkait.

Next Actions

- Meminta kembali Buku Panduan Penggunaan E-Office
- Koordinasi jadwal sosialisasi dengan seluruh bagian
- Melaksanakan sosialisasi dan simulasi penggunaan aplikasi
- Melakukan evaluasi pemahaman pengguna serta menindaklanjuti kendala yang ditemukan

Update Saat ini

B2.1 Pembuatan Aplikasi Identity & Access Management (IAM)

Program Strategis	Pembuatan Prototipe IAM	PIC	Bagian Teknologi Informasi (IT Development)
Deskripsi	Pengembangan prototipe Identity and Access Management (IAM) untuk mengelola hak akses pengguna terhadap aplikasi perusahaan secara terstruktur, terkontrol, dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing bagian.	Target	W2 Oktober 2026

Update progress

S.d saat ini	100%

Progress			Timeline							
Objective	Status		Oktober				November			
			1	2	3	4	1	2	3	4
1. Melakukan analisis kebutuhan sistem Identity and Access Management (IAM) untuk pengelolaan akun dan hak akses pengguna terhadap aplikasi perusahaan	●	Target	■							
		Real	■							
2. Melakukan konfigurasi sistem serta penyesuaian fungsi pengelolaan akun dan hak akses	●	Target	■							
		Real	■							
3. Melakukan pengujian fungsi autentikasi dan validasi hak akses pengguna.	●	Target		■						
		Real		■						
4. Melakukan evaluasi hasil pengujian dan perbaikan terhadap fungsi sistem yang belum sesuai.	●	Target		■						
		Real		■						
5. Melakukan pemeriksaan akhir dan penyusunan dokumentasi fungsi IAM untuk mendukung pengelolaan akses aplikasi oleh Tim IT.	●	Target		■						
		Real		■						

Status Capaian: Rencana/*on-going* · Selesai · Sedikit Tertunda · Perlu Perhatian Khusus

Update Saat ini

Update sd Saat ini

- Pembauatan prototipe Website IAM untuk mengatur hak akses aplikasi

PICA

- **Problem Identification (PI):** Pengelolaan hak akses aplikasi perlu dikembangkan agar dapat disesuaikan dengan fungsi dan kebutuhan masing-masing bagian.
- **Corrective Action (CA):** Menyempurnakan prototipe IAM dengan menambahkan fitur pengaturan hak akses berdasarkan bagian dan fungsi pengguna.

Next Actions

- Penambahan fitur bulk untuk hak akses perbagian bukan perorangan

B2.2 Pembuatan Prototpe Single Sign On

Program Strategis	Pembuatan prototipe Single Sign On	PIC	Bagian Teknologi Informasi(IT Development)
Deskripsi	Memudahkan User dengan hanya login 1x saja untuk login pada semua aplikasi dengan metode SSO (Single Sign On)	Target	**W2 Oktober 2026**

Update progress

S.d saat ini	100%

Progress		Timeline													
Objective	Status	Oktober				November				Maret				April	
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
1. Melakukan identifikasi kebutuhan integrasi Single Sign-On (SSO) untuk menyederhanakan proses login pengguna pada aplikasi perusahaan.	Target														
	Real														
2. Merancang mekanisme autentikasi terpusat agar pengguna dapat mengakses berbagai aplikasi menggunakan satu sesi login	Target														
	Real														
3. Melakukan konfigurasi mekanisme login dan pengelolaan sesi pengguna pada sistem SSO.	Target														
	Real														
4. Melakukan pengujian & Evaluasi proses login, perpindahan akses antaraplikasi, dan validasi sesi pengguna.	Target														
	Real														
5. Melakukan verifikasi fungsi SSO dan menyusun dokumentasi alur autentikasi serta integrasi aplikasi.	Target														
	Real														

Status Capaian: Rencana/*on-going* · Selesai · Sedikit Tertunda · Perlu Perhatian Khusus

Update Saat ini

Update sd Saat ini

- Pembuatan prototipe Website SSO untuk mengakses aplikasi yang sudah diatur melalui IAM

PICA

- **Problem Identification (PI):** Diperlukan penyempurnaan integrasi autentikasi dan pengelolaan sesi pengguna agar mekanisme Single Sign-On (SSO) dapat berjalan sesuai kebutuhan akses aplikasi perusahaan.
- **Corrective Action (CA):** Melakukan pengujian autentikasi dan integrasi antar aplikasi, mengevaluasi kendala yang ditemukan, serta menyempurnakan fungsi dan dokumentasi alur SSO berdasarkan hasil pengujian.

Next Actions

- Penyempurnaan informasi agar lebih informatif

B2.3 Pembuatan Prototipe Ticketing Aduan Internal IT

Program Strategis	Pembuatan prototipe Ticketing Aduan Internal IT	PIC	Bagian Teknologi Informasi(IT Development)
Deskripsi	Memudahkan tim IT kinra menerima laporan masalah TI diperusahaan	Target	Penyelesaian W2 Oktober 2026

Update progress

S.d saat ini	90%

Progress			Timeline													
Objective	Status		Oktober				November				Maret				April	
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
1. Melakukan analisis kebutuhan sistem ticketing untuk memfasilitasi pelaporan kendala teknologi informasi di lingkungan PT KINRA.	●	Target	■													
		Real	■													
2. Mengembangkan fitur pembuatan tiket aduan IT yang dapat digunakan oleh karyawan untuk melaporkan permasalahan	●	Target	■													
		Real	■													
3. Melakukan pengujian proses pembuatan tiket, pengelolaan laporan, dan pemantauan status aduan.	●	Target	■													
		Real	■													
4. Melakukan evaluasi fungsionalitas sistem dan perbaikan terhadap kendala yang ditemukan selama pengujian.	●	Target		■												
		Real		■												
5. Melakukan verifikasi akhir dan menyusun dokumentasi penggunaan sistem ticketing untuk mendukung proses penanganan aduan IT secara terstruktur.	●	Target		■												
		Real		■												
5. Penambahan Fitur	●	Target			■											
		Real			■											

Status Capaian: ● Rencana/*on-going* ● Selesai ● Sedikit Tertunda ● Perlu Perhatian Khusus

Update Saat ini

Update sd Saat ini

- Telah Dilakukan Pembuatan Link Pendataan kebutuhan digitalisasi
- Pendistribusian memo ke setiap bagian untuk dapat ditindaklanjuti masing masing bagian

PICA

- **Problem Identification (PI):** Diperlukan penyempurnaan sistem ticketing untuk memastikan pelaporan, pemantauan status, dan penanganan aduan IT dapat dilakukan secara terstruktur serta terukur.
- **Corrective Action (CA):** Menyempurnakan sistem ticketing melalui penambahan fitur SLA untuk memantau batas waktu penanganan aduan dan fitur ekspor laporan untuk mendukung dokumentasi serta evaluasi kinerja layanan IT.

Next Actions

- Penambahan fitur SLA untuk batas tepat waktu nya.
- Penambahan fitur Ekspor untuk laporan penyelesaian.

Danantara Indonesia

Update progress

B2.5 Pembuatan Web Dashboard Bagian Mekanikal

Perkebunan Nusantara

Program Strategis	Pembuatan Web Dashboard bagian Mekanikal	PIC	Bagian Teknologi Informasi (IT Development)
Deskripsi	Memudahkan Bagian Mekanikal, Elektrikal, Fasilitas & Keamanan dalam merekap EAP dan Kwh	Target	Penyelesaian W4 Oktober 2026

S.d saat ini **90%**

Progress		Timeline															
Objective	Status	Oktober				November				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		
1. Membangun sistem penugasan kendaraan operasional terintegrasi yang mencakup penerbitan surat tugas pengemudi, pencatatan logbook kilometer (odometer) awal dan akhir, monitoring konsumsi bahan bakar (BBM), serta otomasi pembaruan ketersediaan unit dan status driver secara *real-time*.	Target																
	Real																
2. Membangun sistem pencatatan konsumsi energi listrik tenant kawasan terintegrasi dengan teknologi AI Vision (Google Gemini) untuk membaca angka meteran secara otomatis dari kamera teknisi lapangan, melakukan validasi stand meter, serta mengkalkulasi pemakaian riil (kWh) dan estimasi tagihan listrik secara presisi.	Target																
	Real																
3. Mengimplementasikan manajemen siklus periode konsumsi listrik dengan mekanisme *auto-expire* berbasis kalender, validasi mandatori target RKAP bulanan sebelum penugasan diterbitkan, serta penyajian grafik telemetri realisasi vs RKAP di dashboard utama untuk pemantauan manajemen.	Target																
	Real																
4. Meningkatkan kenyamanan pengguna melalui penerapan standar antarmuka enterprise (tabel ringkas dengan modal detail, dialog peringatan dan konfirmasi kustom terpusat tanpa dialog bawaan browser), serta mengeliminasi kendala keterlambatan visual (*layout shift*) menggunakan sistem *global loading skeleton* dan *top progress bar*.	Target																
	Real																
5. Menyelaraskan integrasi hak akses berbasis peran dengan KINRA IAM secara ketat (pemilahan wewenang Admin Kantor, Kasubag, Kabag, Driver, dan Teknisi), memastikan integritas penyimpanan data persisten langsung ke database Supabase, serta mempersiapkan fondasi arsitektur untuk	Target																
	Real																

Update sd Saat ini

- Telah Dilakukan Pembuatan Link Pendataan kebutuhan digitalisasi
- Pendistribusian memo ke setiap bagian untuk dapat ditindaklanjuti masing masing bagian

PICA

- **Problem Identification (PI):** Diperlukan penyempurnaan sistem ticketing untuk memastikan pelaporan, pemantauan status, dan penanganan aduan IT dapat dilakukan secara terstruktur serta terukur.
- **Corrective Action (CA):** Menyempurnakan sistem ticketing melalui penambahan fitur SLA untuk memantau batas waktu penanganan aduan dan fitur ekspor laporan untuk mendukung dokumentasi serta evaluasi kinerja layanan IT.

Next Actions

- Penambahan fitur SLA untuk batas tepat waktu nya.
- Penambahan fitur Ekspor untuk laporan penyelesaian.

Status Capaian
- Rencana/*on-going*
- Selesai
- Sedikit Tertunda
- Perlu Perhatian Khusus

Update Saat ini

B2.6 Pengadaan

Program Strategis	Pengadaan Infrastruktur Digital dan Subscription AI untuk Akselerasi Pengembangan Aplikasi KEK Sei Mangkei	PIC	Bagian Teknologi Informasi(IT Development)
Deskripsi	Memudahkan tim IT kinra menerima laporan masalah TI diperusahaan	Target	Penyelesaian W2 Oktober 2026

Update progress

S.d saat ini	90%

Progress		Timeline															
Objective	Status	Oktober				November				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		
1. Melakukan analisis kebutuhan sistem ticketing untuk memfasilitasi pelaporan kendala teknologi informasi di lingkungan PT KINRA.	Target																
	Real																
2. Mengembangkan fitur pembuatan tiket aduan IT yang dapat digunakan oleh karyawan untuk melaporkan permasalahan	Target																
	Real																
3. Melakukan pengujian proses pembuatan tiket, pengelolaan laporan, dan pemantauan status aduan.	Target																
	Real																
4. Melakukan evaluasi fungsionalitas sistem dan perbaikan terhadap kendala yang ditemukan selama pengujian.	Target																
	Real																
5. Melakukan verifikasi akhir dan menyusun dokumentasi penggunaan sistem ticketing untuk mendukung proses penanganan aduan IT secara terstruktur.	Target																
	Real																
5. Penambahan Fitur	Target																
	Real																

Status Capaian: Rencana/*on-going* · Selesai · Sedikit Tertunda · Perlu Perhatian Khusus

Update Saat ini

Update sd Saat ini

- Telah Dilakukan Pembuatan Link Pendataan kebutuhan digitalisasi
- Pendistribusian memo ke setiap bagian untuk dapat ditindaklanjuti masing masing bagian

PICA

- **Problem Identification (PI):** Diperlukan penyempurnaan sistem ticketing untuk memastikan pelaporan, pemantauan status, dan penanganan aduan IT dapat dilakukan secara terstruktur serta terukur.
- **Corrective Action (CA):** Menyempurnakan sistem ticketing melalui penambahan fitur SLA untuk memantau batas waktu penanganan aduan dan fitur ekspor laporan untuk mendukung dokumentasi serta evaluasi kinerja layanan IT.

Next Actions

- Penambahan fitur SLA untuk batas tepat waktu nya.
- Penambahan fitur Ekspor untuk laporan penyelesaian.

B3.1 Pemenuhan Ketersediaan Jaringan Starlink di Gedung Graha

Program Strategis	Pemenuhan Ketersediaan jaringan Starlink di Gedung Graha	PIC	Bagian Teknologi Informasi(IT Development)
Deskripsi	Pemenuhan kebutuhan konektivitas jaringan internet melalui pengadaan dan pemasangan perangkat Starlink serta router pendukung di Gedung Graha untuk meningkatkan ketersediaan dan jangkauan jaringan internet pada lantai 1 dan 2.	Target	Penyelesaian W4 Oktober 2026

Update progress

S.d saat ini	30%

Progress			Timeline							
Objective	Status		Oktober				November			
			1	2	3	4	1	2	3	4
1. Melakukan koordinasi dengan pihak Vijja Net untuk identifikasi kebutuhan perangkat jaringan.		Target								
		Real								
2. Menyusun kebutuhan perangkat Starlink dan router untuk lantai 1 dan 2.		Target								
		Real								
3. Melakukan pengajuan persetujuan pembelian Barang kepada Direktur.		Target								
		Real								
4. Melakukan proses pengadaan perangkat melalui Bagian Pengadaan.		Target								
		Real								
5. Melakukan pemasangan dan konfigurasi perangkat jaringan Starlink dan router.		Target								
		Real								

Status Capaian: Rencana/*on-going* · Selesai · Sedikit Tertunda · Perlu Perhatian Khusus

Update sd Saat ini

- Koordinasi dengan Pihak Vijja Net untuk pendataan peralatan yang dibutuhkan untuk pemasangan Router Baru di lantai 1 dan 2
- Pengajuan kepada Direktur untuk Pembelian alat untuk pemenuhan konektivitas jaringan internet

PICA

- **Problem Identification (PI):** Pemenuhan kebutuhan jaringan internet di lantai 1 dan 2 Gedung Graha masih memerlukan router pendukung agar jaringan Starlink yang berada di lantai 3 dapat masuk ke lantai 1 dan 2.
- **Corrective Action (CA):** Menindaklanjuti proses pengadaan perangkat bersama Bagian Pengadaan serta berkoordinasi dengan pihak Vijja Net untuk memastikan pemasangan, konfigurasi, dan pengujian konektivitas jaringan dapat dilaksanakan secepatnya

Next Actions

- Pembelian barang melalui pengadaan barang di bagian pengadaan

Update Saat ini

B3.2 Pemasangan Starlink di Ruang Rapat Pusat Inovasi

Program Strategis	Pemasangan Starlink di Ruang Rapat Pusat Inovasi	PIC	Bagian Teknologi Informasi (IT Infrastructure & Operation)
Deskripsi	Pemasangan & Konfigurasi jaringan untuk dapat digunakan pada setiap acara PT KINRA yang diselenggarakan di Ruang Rapat Nusantara Pusat Inovasi	Target	Penyelesaian W2 Oktober 2026

Update progress

S.d saat ini	100%

Progress			Timeline													
Objective	Status		Oktober				November				Maret				April	
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
1. Melakukan persiapan dan identifikasi kebutuhan pemasangan Starlink di Ruang Rapat Pusat Inovasi.		Target														
		Real														
2. Melakukan pemasangan perangkat Starlink dan konfigurasi jaringan internet.		Target														
		Real														
3. Melakukan pengujian konektivitas dan kestabilan jaringan internet.		Target														
		Real														
4. Memastikan jaringan dapat digunakan untuk mendukung kegiatan rapat dan operasional perusahaan.		Target														
		Real														

Status Capaian: Rencana/*on-going* · Selesai · Sedikit Tertunda · Perlu Perhatian Khusus

Update sd Saat ini

- Sudah dilakukan Pemasangan & Konfigurasi jaringan untuk dapat digunakan pada setiap acara PT KINRA yang diselenggarakan di Ruang Rapat Nusantara Pusat Inovasi

PICA

- **Problem Identification (PI):** Diperlukan pemantauan keandalan jaringan Starlink untuk memastikan konektivitas internet di Ruang Rapat Pusat Inovasi tetap stabil dalam mendukung kegiatan rapat perusahaan.
- **Corrective Action (CA):** Melakukan monitoring konektivitas secara berkala serta menindaklanjuti gangguan yang ditemukan guna menjaga kestabilan dan ketersediaan jaringan internet.

Next Actions


- Pemantauan Kehandalan Jaringan untuk mendukung kegaitan operasional Perusahaan

Update Saat ini



kinra SEI MANGKEI


Appendix Bidang Manajemen Risiko

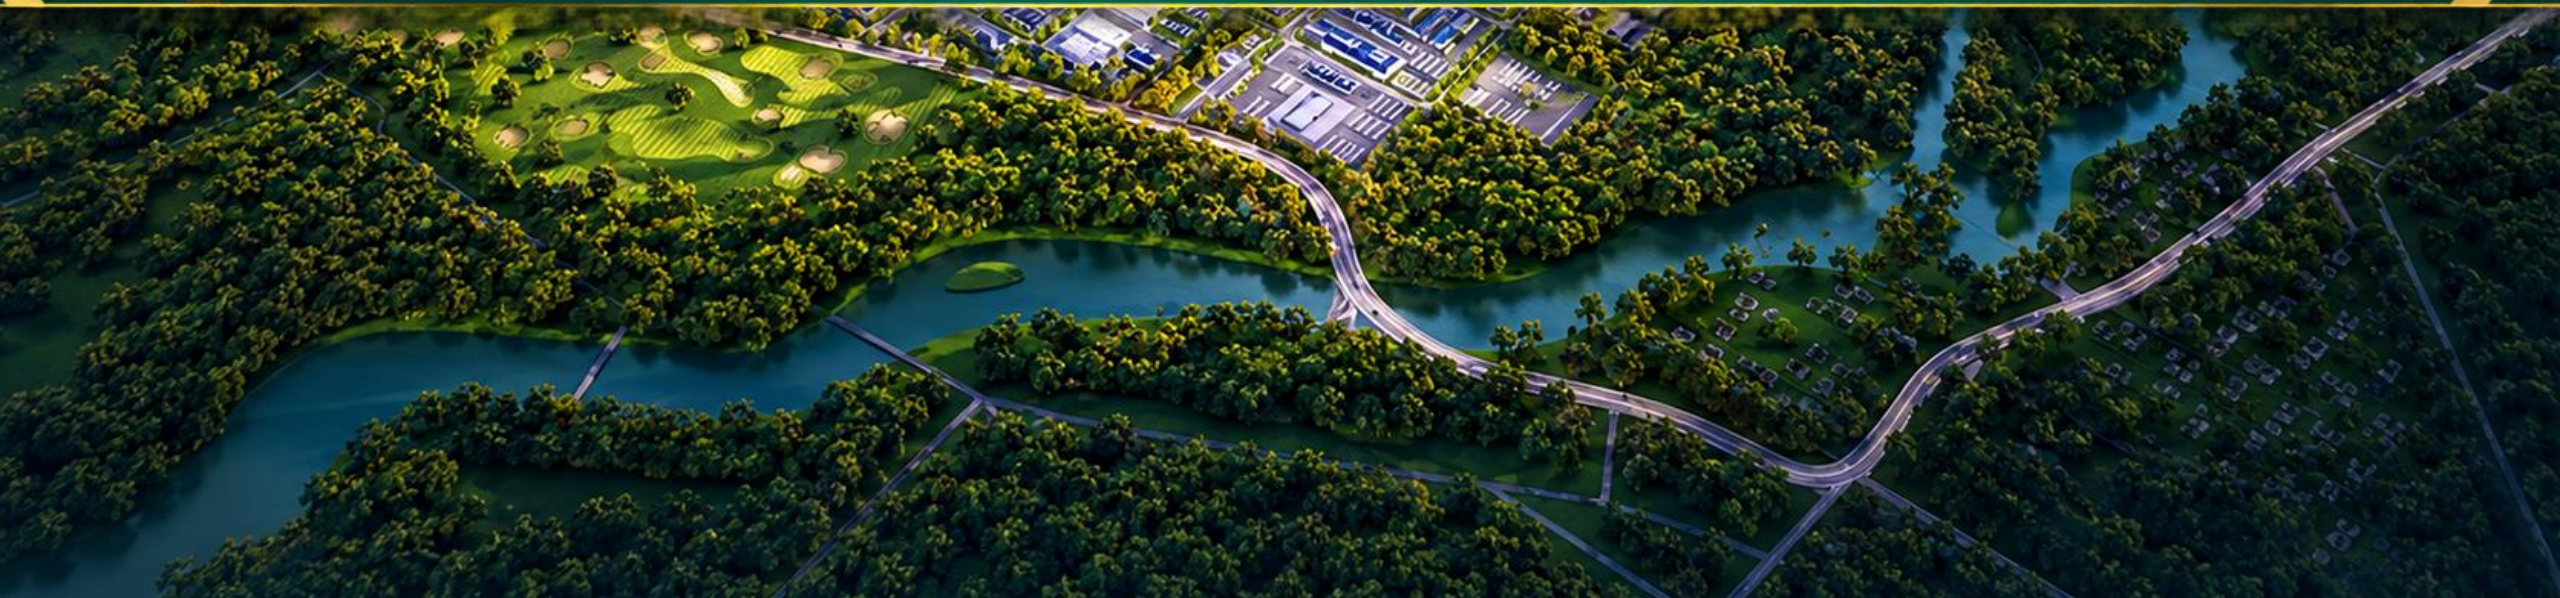



kinra SEI MANGKEI

Appendix Bidang Teknologi Informasi

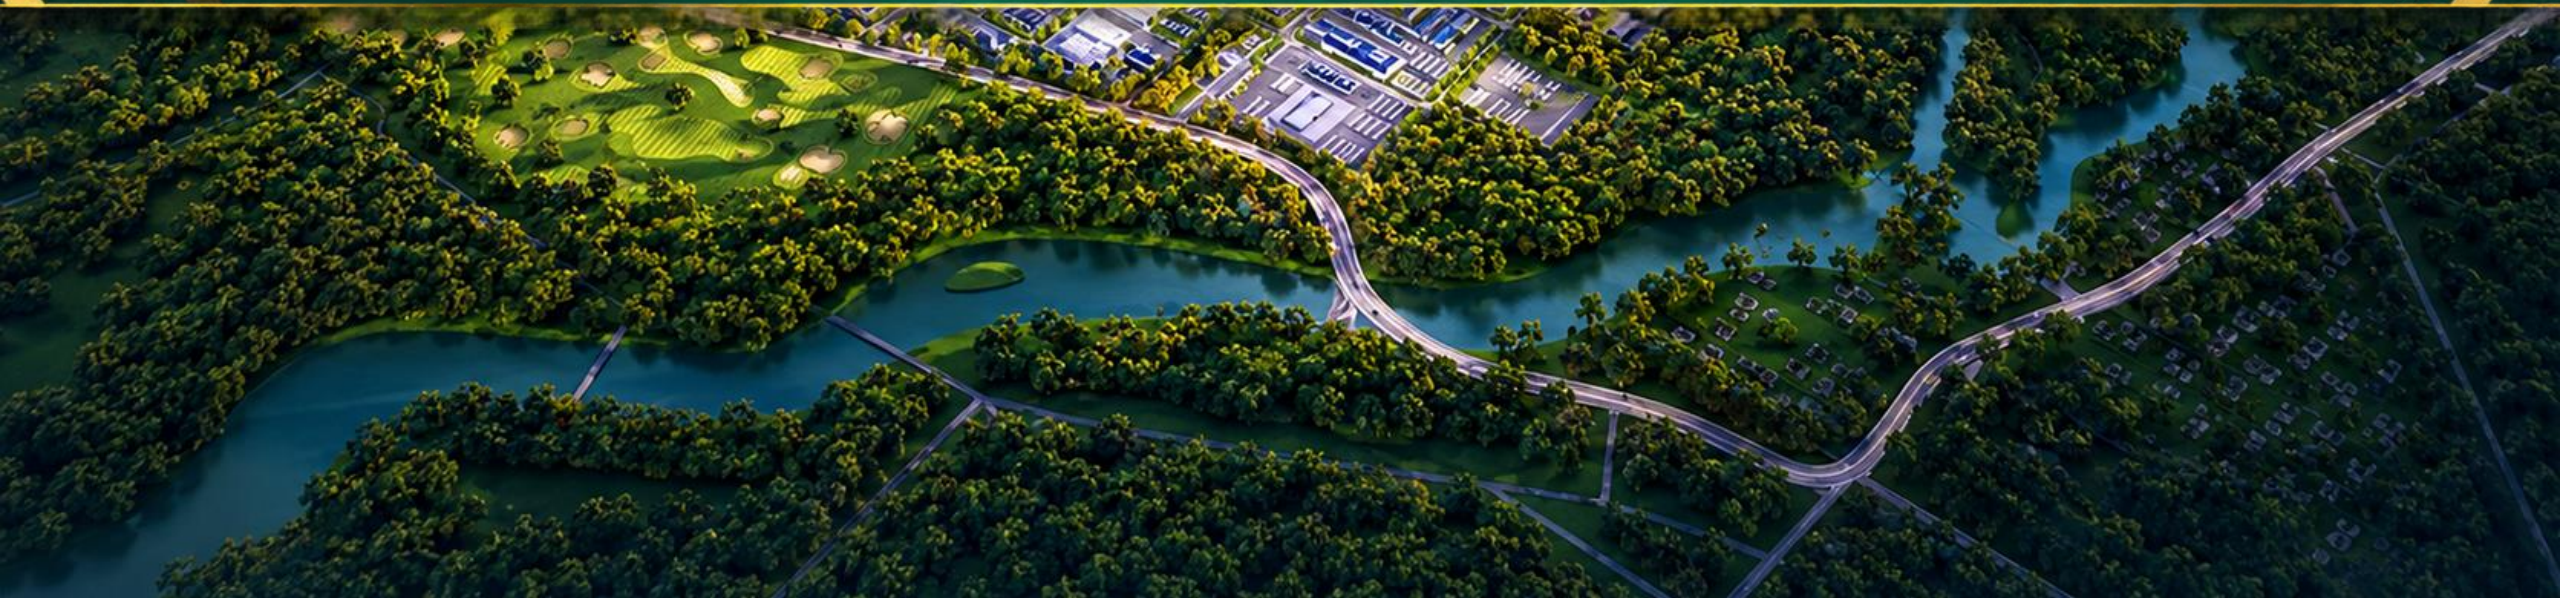

B1.2 Sosialisasi Penggunaan E-Office

